


사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
경상북도(면지역) 영주시(동지역)	계속	재정	임기외 (2022~2031)	43,300백만원 (도비35,000, 시비8,300)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (25%)	건설과 토목팀	과 장	황규원(☎6700)	
		팀 장	한용호(☎6711)	
		담당자	오유석(☎6713)	

□ 공약목표

❖ 선형개량 및 확포장을 통해 도로를 이용하는 주민들에게 쾌적한 통행환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 상망동(진우)~부석면
- 사업량 : 선형개량 및 확포장 L=16.0km
 - 기완료구간(동지역) 1.0km, 현재추진구간(면지역) 4.36km, 잔여구간 10.64km
- 사업비 : 43,300백만원(도비 35,000 / 시비 8,300)
- 사업기간 : 2018년~2031년(14년간)
- 사업 추진현황

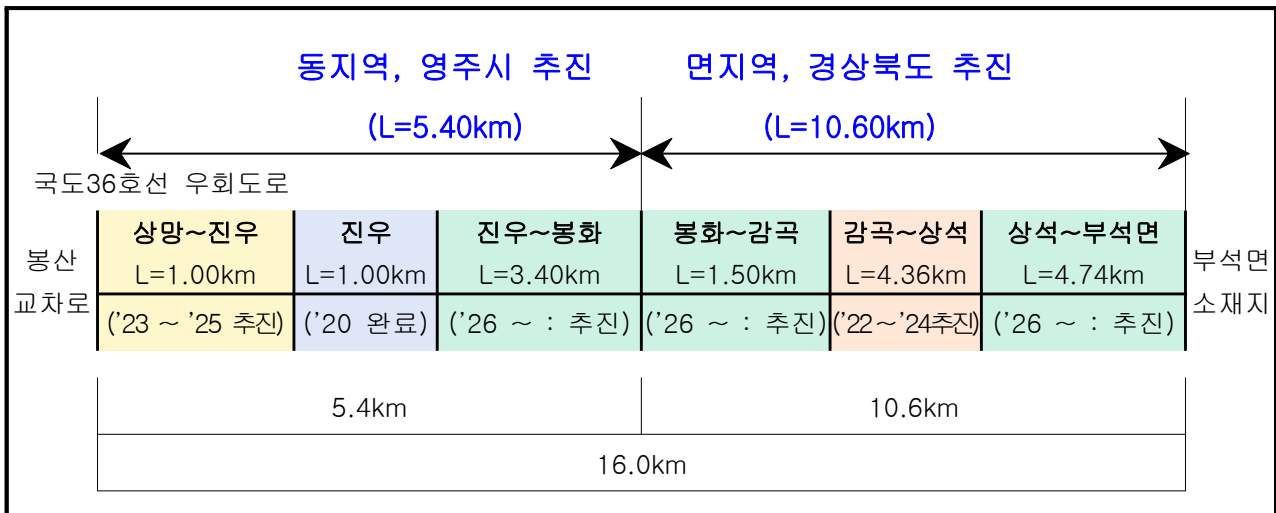

□ 추진상황 및 계획

- 동지역(영주시 시행)
 - '20.11월 : (동지역) 진우구간(L=1.00km) 공사 준공
 - '23. 1월 : (동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 기본설계용역(~'23. 4월)
 - '23.10월 : (동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 실시설계용역(~'23.12월)
 - '23.12월 : 노선 결정 관련 방문 협의
 - '24. 5월 : (동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 공사 착공
 - '25.12월 : (동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 준공 예정
- 면지역(경북도 시행)
 - '22. 3월 : (면지역) 감곡~상석구간(L=4.36km) 공사 착공
 - '24.12월 : (면지역) 감곡~상석구간(L=4.36km) 준공 예정
 - '25. 1월 : 미시행 구간(3개 구간, L=9.64km) 사업 추진

□ 연도별 추진상황 및 계획

	2022년까지	2023년	2024년	2025년이후
영주시 (동구간)	<ul style="list-style-type: none"> •11월 진우구간 준공 •사업량 : L=1.0km •사업비 : 36억 	<ul style="list-style-type: none"> •2월 상망~진우구간 설계 (사업량 : L=1.0km) 	<ul style="list-style-type: none"> •2월 상망~진우구간 착공 •사업량 : L=1.0km •사업비 : 13억 	<ul style="list-style-type: none"> •25년 12월 상망~진우구간 준공 •26년 1월 진우~봉화구간 착수
경상북도 (면구간)	<ul style="list-style-type: none"> •3월 감곡~상석구간 착공 •사업량 : L=4.36km •사업비 : 126억 	<ul style="list-style-type: none"> •1월 ~ 12월 감곡~상석구간 공사 추진 	<ul style="list-style-type: none"> •12월 감곡~상석구간 공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> •25년 ~ 26년 봉화~감곡구간(L=1.5km) 상석~부석구간(L=4.7km) 실시설계 및 공사착공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	8,300			8,300		4,350			4,350	
기투자	3,600			3,600		3,600			3,600	
'22										
'23	50			50		50			50	
'24	1,000			1,000		700			700	
'25	1,000			1,000						
'26	2,650			2,650						
'27이후										

□ 목표달성 확인지표

확인 지표	단위	추진실적		2022년까지	2023년	2024년	2025년	2026년이후
사업 진척률	%	목표	100%	20%	30%	40%	60%	100%
				진우구간 준공 (시구간) 감곡~상석 구간 추진 (도구간)	설계완료 (시구간)	상망~진우 구간 착공 (시구간) 감곡~상석 구간 준공 (도구간)	상망~진우 구간 준공 (시구간)	진우~봉화 구간 착수 (시구간) 봉화~감곡/ 상석~부석면 구간 착수 (도구간)
		실적	30%	20%	30%	-	-	-
				진우구간 준공 (시구간) 감곡~상석 구간 추진 (도구간)	기본설계 완료 / 실시설계 용역 중	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 사업 대상 노선 연장이 길어 사업기간 및 사업비 과다 소요
 - ⇒ 영주시 추진(동지역) 구간은 특교세 확보 (400백만원)
 - ⇒ 경상북도 추진(면지역) 구간은 지방도 종합정비계획 우선반영으로 조기 사업 추진
- 실시설계용역 중 주민들의 노선 변경 요구사항 발생
 - ⇒ 노선결정 재협의시 노선 변경 요청으로 설계반영 추진

□ 기대효과

- 선형개량 및 확포장을 통해 시민들에게 쾌적하고 안전한 통행환경 제공
