

가흥신도시 가로등 확충

관리번호	5-3-2		
사업명	가흥신도시 가로등 확충	추진현황	진도
		추진중	67%
담당부서	건설과 토목팀	담당자	김중수(☎ 639-6717)

■ 사업개요

- 위 치 : 영주시 가흥동 가흥신도시
- 사업기간 : 2014 ~ 2017(4년간)
- 사업량 : 가로등 209등(100%), 보안등 400등(기설치 195, 장래 205)
- 사업비 : 423백만원

■ 추진상황(실적)

- 2013년 까지 : 대로변 가로등 209등 설치완료
- 2014. 03월 : 설치대상구간 조사실시
- 2014. 04월 : 2014년 시행 대상지 확정 후 발주(보안등 30등)
- 2014. 08월 : 가흥1동사무소 발주분(보안등 20등)완료
- 2014. 11월 : 2014년 시행 보안등 설치공사 준공
- 2014. 12월 : 한국전력공사와 한전주 활용관련 사전협의
- 2015. 11월 : 가흥1동 신도시지구 보안등 58개소 설치
- 2016. 07월 : 가흥1동 신도시지구 보안등 30개소 설치
- 2016. 12월 : 가흥1동 신도시지구 보안등 19개소 설치
- 2016. 12월 : 코아루노블 진입로 가로등(보안등) 5개소 설치
- 2017. 04월 : 부영아파트주변 가로등(보안등)12개소 설치
- 2017. 06월 : 보안등 가흥1동 24개소, 가흥2동 : 7개소
- 2017. 08월 : 보안등 가흥1동 34개소, 가흥2동 : 17개소


■ 향후 추진계획

- 가흥동 신도시지구 입주민이 계속 늘어나며, 범죄예방 및 심야 안전한 보행을 위한 가로등(보안등) 설치사업 지속추진 필요


■ 문제점 및 대책

- 보안등 설치 제외지역(단독가구 등) 보안등 설치요구
- 위치선정시 민원사항 발생우려
- 신도시 내 건물신축에 맞추어 민원 최소화 될 수 있도록 추진

■ 사업추진 내용 및 결과물

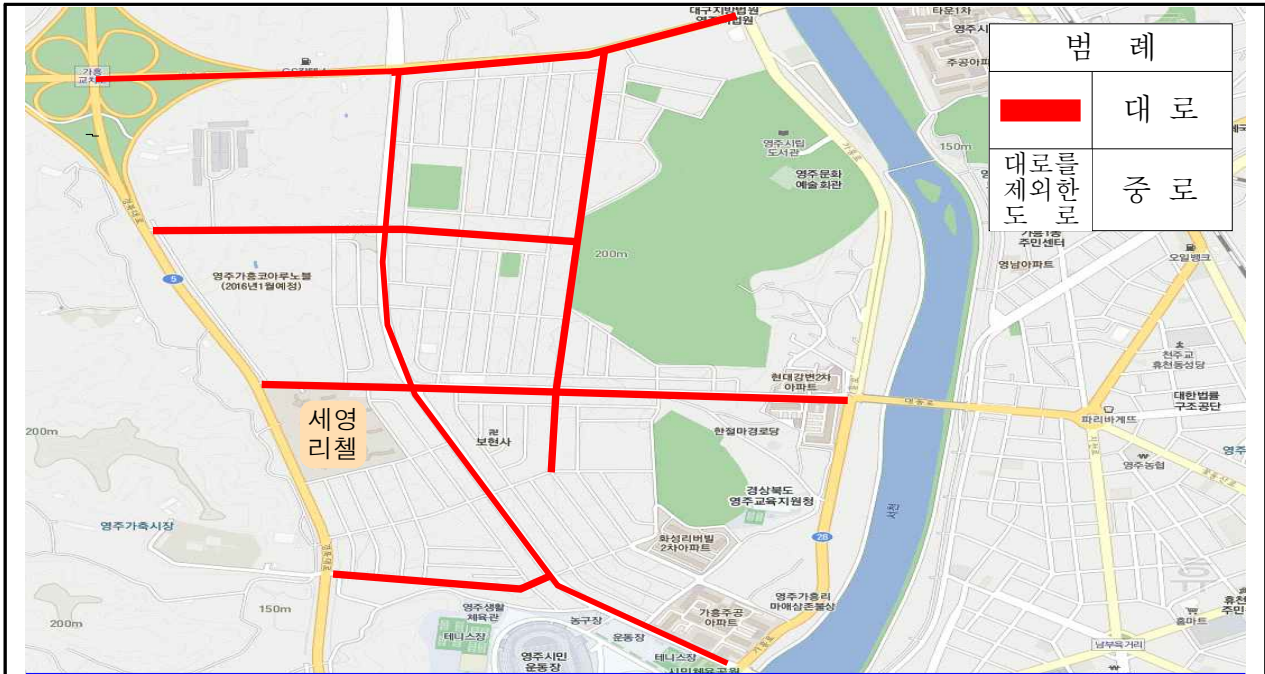

택지지구 (대로 : 적색 중로 : 적색외 도로)

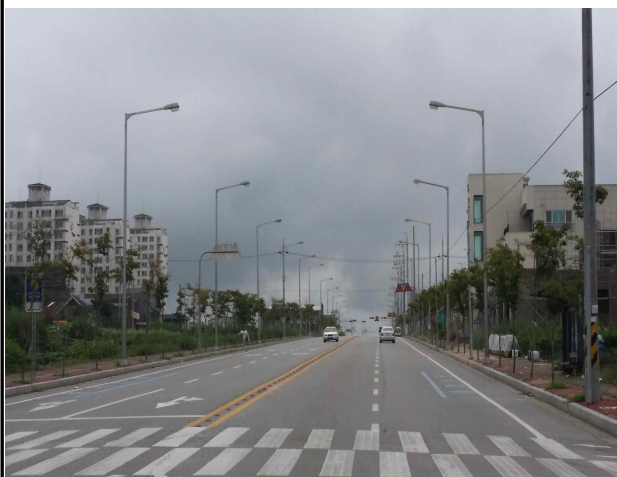

가로등 : 대로 209등 설치완료



보안등 : 중로

담당부서	건설과	건설과장	이영희	☎639-6700
		토목팀장	박정락	☎639-6712
		주무관	김중수	☎639-6717
