

## 2-9 영주댐 연계 남부지역 항구적 가뭄해소 추진

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2017년 ~ 2021년)	추진중	29,025백만원 (시 29,025)	30%	건설과 농업기반팀
담당자	과장:강한원(☎639-6700) 팀장:신상철(☎6731) 주무관:고동익(☎6732)				

### 1 사업개요

- 위 치 : 영주시 이산면, 평은면, 문수면 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 29,025백만원(2020년 6,834백만원)
- 사업내용 : 취수탑설치 3개소, 송·배수관로설치 76.4km

### 2 추진상황

- '17. 11월 : 문수면 만방리, 평은면 평은리·천본리 송수관로설치공사 기본 및 실시 설계용역 시행
- '18. 03월 : 용역과제 심의회 심의의결(동막취수탑설치)
- '18. 04월 : 평은, 새뱅이 취수탑 설치 완료
- '18. 09월 : 이산면 질골지구 소규모용수개발사업 외 3건 기본 및 설계용역 시행
- '18. 09월 : 이산면 질골지구 소규모용수개발사업 기본 및 실시 설계용역 시행
- '19. 12월 : 문수면 만방리, 평은면 평은리·천본리 송수관로 설치공사 기본 및 실시설계용역 준공
- '20. 07월 : 이산면 질골지구 소규모용수개발사업 외 3건 기본 및 설계용역 준공

### 3 문제점 및 대책

- 문제점 : 영주댐 협의체 구성으로 인하여 댐 운영 불명확으로 사업 발주 어려움
- 대 책 : 영주댐 협의체 구성에 따라 현재 사업 시행 여부가 불명확하므로 협의체의 댐 운영방안 확정 후 사업 시행 여부 검토

### 4 향후 추진계획


- 2020. 10월~ : 영주댐 협의체 회의 참관 및 사업 시행 여부 검토

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	29,025	5,114	1,013	22,908		9,094	114		8,977		
기투자	2,260			2,260		2,260			2,260		
2020	6,834	114	13	6,717		6,834	114	13	6,717		
2021이후	19,931	5,000	1,000	13,931							

## 6 사업추진 사진

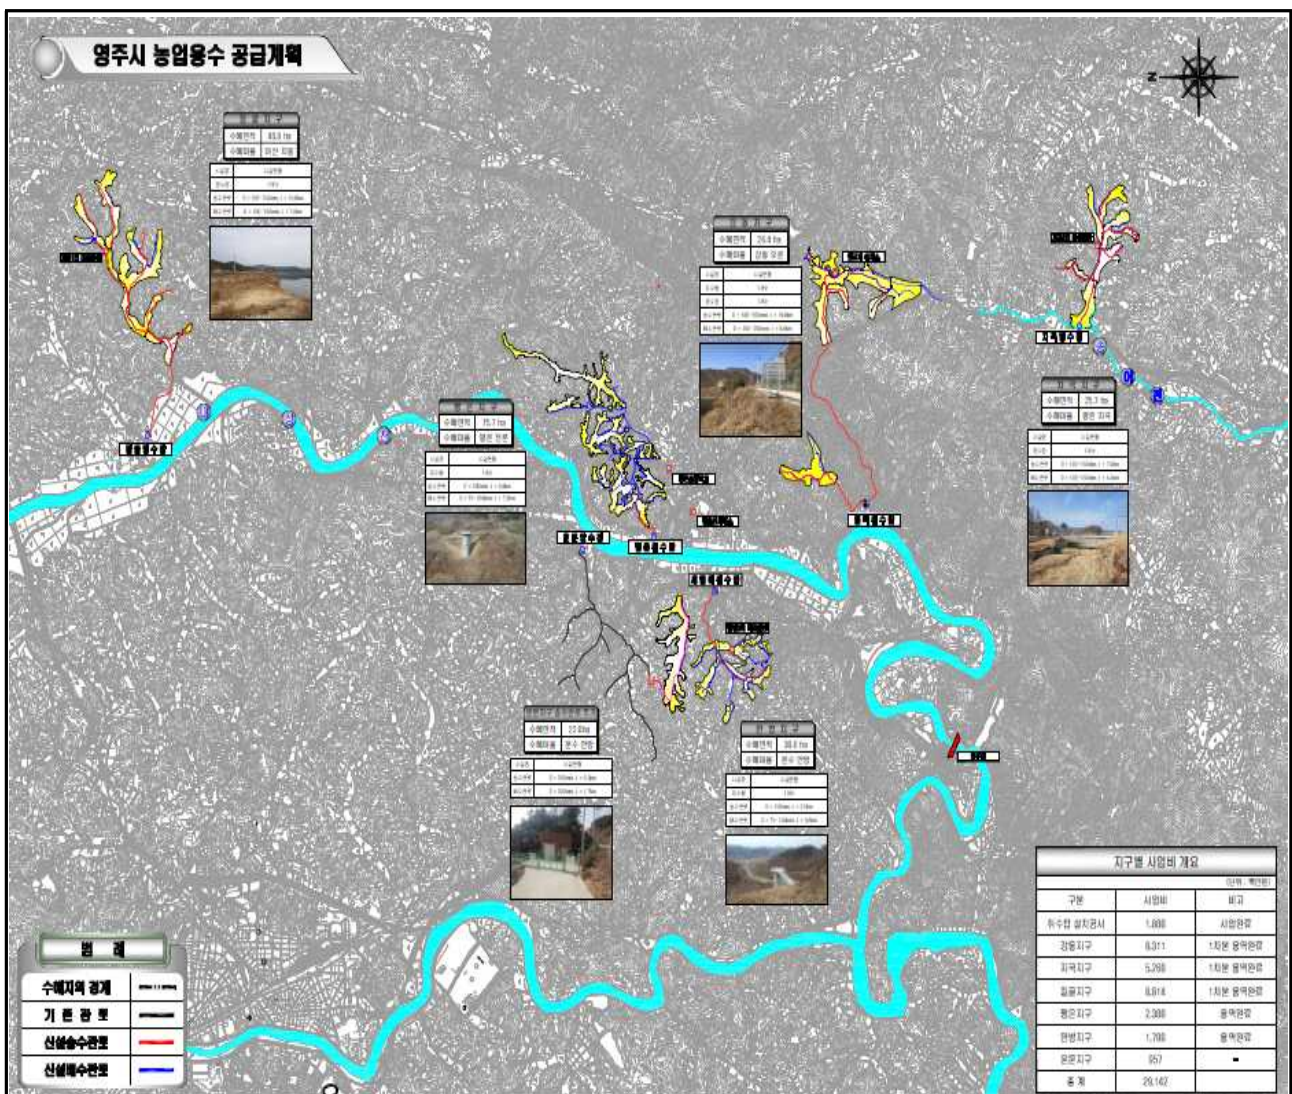

영주댐 연계 남부지역 항구적 가뭄해소 사업
