

한국문화테마파크 조기 완공

관리번호	3-1			
사업명	한국문화테마파크 조기 완공		추진현황	추진중
			추진중	36%
담당부서	문화예술과 문화사업팀	담당자	임상호(☎ 639-6574)	

■ 사업개요

- 위 치 : 영주시 순흥면·단산면(선비문화수련원 인근)
- 사업기간 : 2010 ~ 2020년 / 사업면적 : 960,974m²
- 사업비 : 156,525백만원
- 사업내용 : 한문화R&D센터, 한음악스튜디오, 전통인형극장, 국궁장
전통숙박시설, 전통음식촌, 마상무예장, 전래동화 4D영상관
오픈공연장, 명상정원 등


■ 추진상황(실적)

- 2008.09.10 : 광역경제권 선도프로젝트사업 선정(문화체육관광부)
- 2008.10.13 : 3대문화권 문화·생태기반조성 기본계획수립(문화체육관광부)
- 2011.06.17 : 기본 및 실시설계용역 착수(영주시)
- 2012.12.14 : 설계의 경제성등(VE)검토 완료(경상북도)
- 2012.12.28 : 백두대간권 신발전지역 발전촉진지구 지정(국토교통부)
- 2013.10.30 : 한국문화테마파크 조성사업 착공(토목,건축,전기,통신,소방)
- 2014.10.17 : 토지보상완료(264필지/960,974m²)
- 2015.03.23 : 한국문화테마파크 운영관리 기본계획 수립 용역 착수
- 2017.08.31 : 지하구조물 10동 및 전통건축 22동 완료
전통건축 공사(종합진도 : 37%)

■ 향후 추진계획

- 2017. 9월~2018.12월 : 건축 및 전기,통신 등 기반시설 정비
- 2019~2020년 : 운영관리 실행계획 수립, 준공 및 운영


■ 사업추진 내용 및 결과물

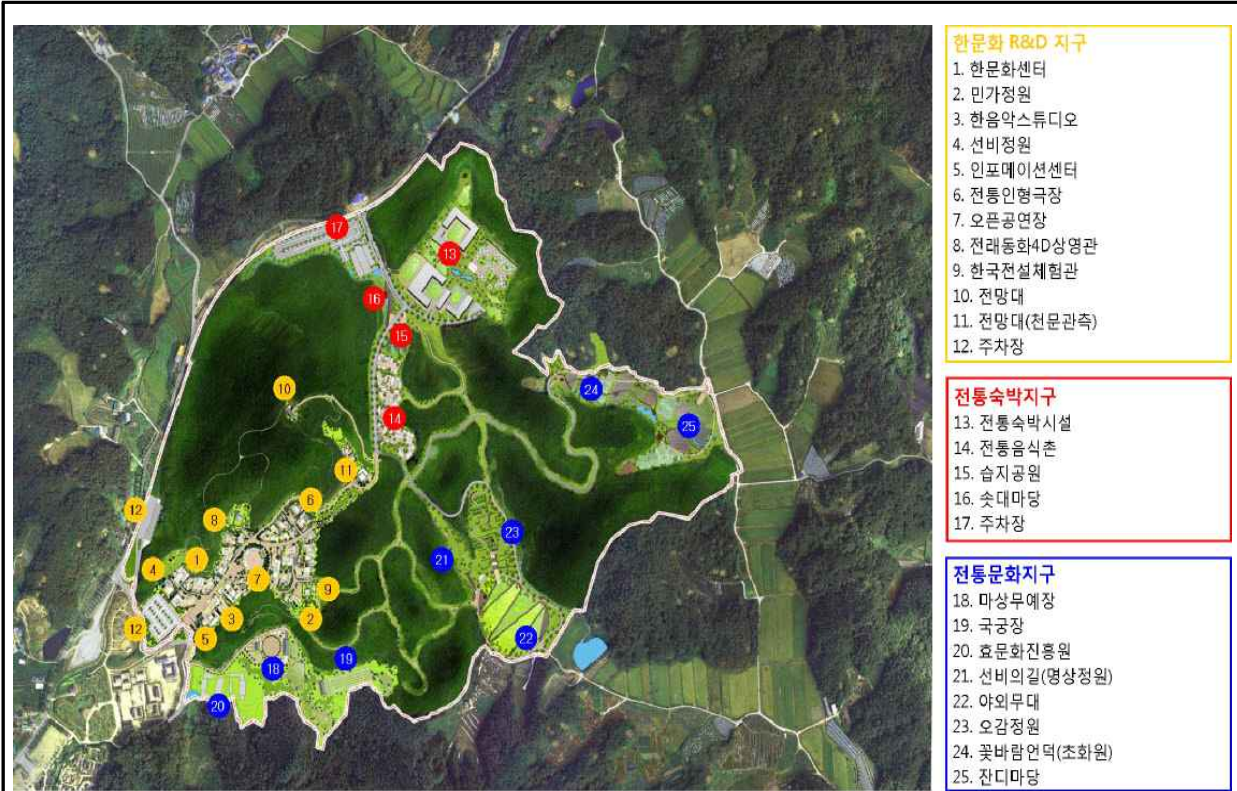

시설물배치도



조감도

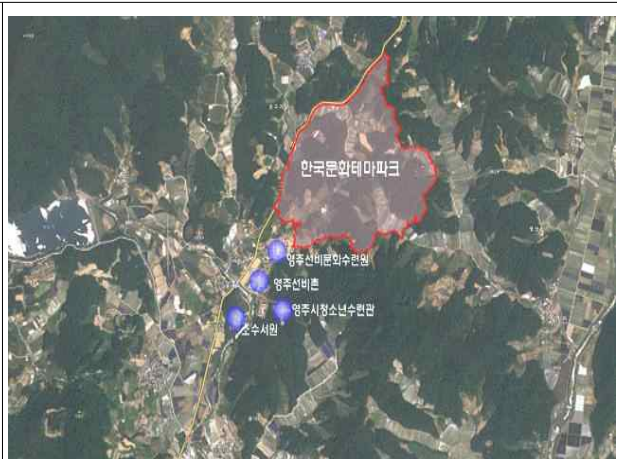

위치도

담당부서	문화예술과	문화예술과장	장사원	☎ 639-6560
		문화사업팀장	황규원	☎ 639-6572
		주무관	임상호	☎ 639-6574
